



下水道事業における被災地支援の枠組みと取り組み方針

- 令和8年熊本地震で大きな被害を受けた県南4市町については、**全国ルール**（正式名称：下水道事業における災害時支援に関するルール）に基づく支援が行われる
- 熊本市は、**現地応援総括者として八代市の下水道管路調査を支援する。**
⇒スクリーニング調査(0次調査)、詳細調査(1次調査)及び管内カメラ調査(2次調査)を実施
- 「上下水道一体の災害対応」の観点から、八代市を支援中の熊本市水道管路応急復旧支援隊とも連携し、水道の復旧方針や通水予定に合わせた下水道管路の機能確保を図る
- 管路調査の支援が完了した後も、災害査定等に向けた技術的な助言を行うなど、被災地に寄り添った支援を継続していく

支援体制(八代市)

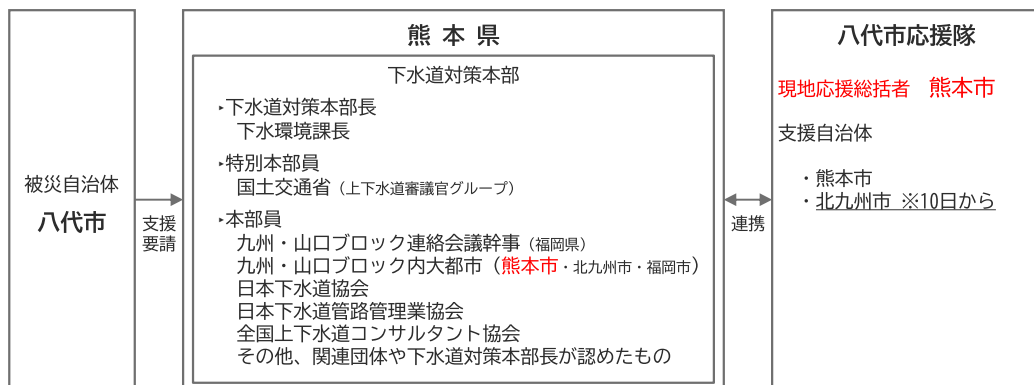

調査計画・スケジュール

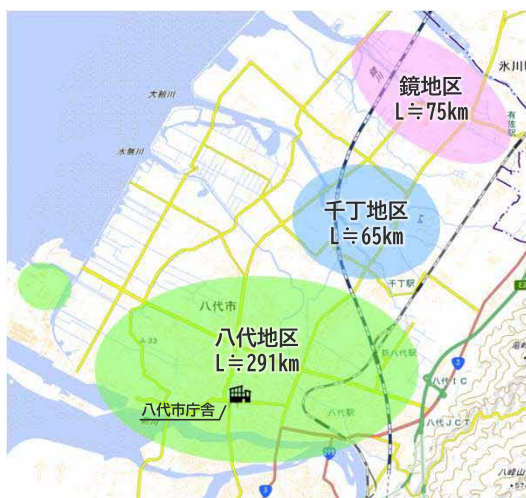

- 支援期間
令和8年8月2日～
- 調査対象延長(汚水管・雨水管)
ΣL≒460km
- 応援隊編成(8/8時点)
管内カメラ調査 2班(いずれも熊本市)

	1	10	8月	20	31
スクリーニング調査 (0次調査)			→ 8/4 完了		
詳細調査 (1次調査)			→ 8/6 完了		
管内カメラ調査 (2次調査)			8/6 開始	→	※

※完了時期未定(被害状況次第)

下水道管路調査活動状況

- 国交省や熊本県・福岡県など関係機関と連携して実施
- 8月2日から管路被災調査(460km)を実施中
- 4日にスクリーニング調査(詳細調査範囲の抽出)完了
- 6日に詳細調査(190km)完了
- 6日から滞水等が確認された管路について、管内カメラ調査(2次調査)を実施

支援状況

〈派遣人数〉	8月2日	...	8月8日	8月9日	8月10日	実施 8月11日	予定 8月12日
派遣人数	15		5	2	11	6	(6)
延べ人数	15		92	94	105	111	(117)
〈調査状況(km)〉							
スクリーニング調査：L=460km ()は累計	0 (0)		完了	—	—	—	—
詳細調査：L=190km ()は累計	—		完了	—	—	—	—
管内カメラ調査：L= 33km ()は累計	—		0.2 (0.6)	0.2 (0.8)	0.5 (1.3)	調査中	

8月10日の活動状況

【作業内容】管内カメラ調査




日本下水道管路管理業協会九州支部と調査を実施




水道事業における被災地支援の枠組みと取り組み方針

- 災害時における応急復旧活動については、日本水道協会(日水協)及び会員水道事業体における応急復旧等の相互応援活動を迅速かつ円滑に実施することを目的とした「相互応援のルール」に基づき対応。
- 本市においては、応援要請のあった八代市に対し「幹事応援水道事業体」及び「応援水道事業体」として、断水解消に向けた復旧計画立案、通水試験、漏水調査、漏水修理等の応急復旧活動の支援を実施。
- 本市は、令和8年(2026年)8月31日を目標に活動。

支援体制(八代市)

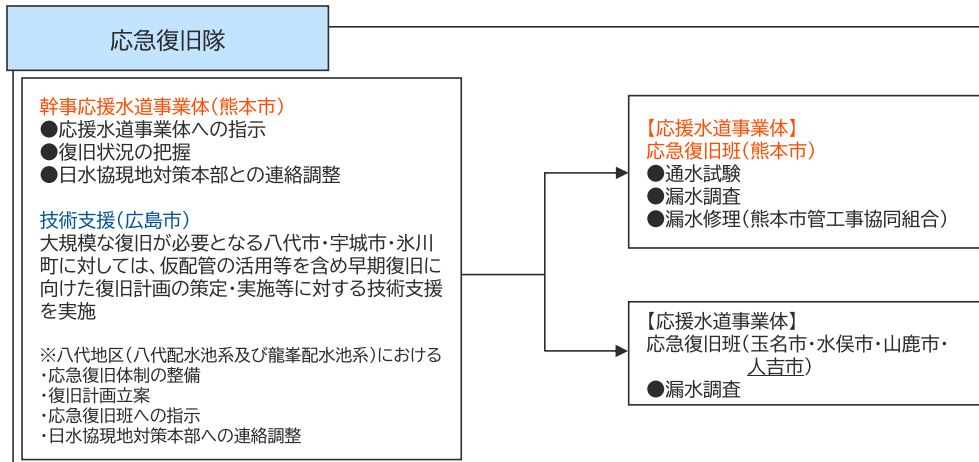

復旧計画・スケジュール

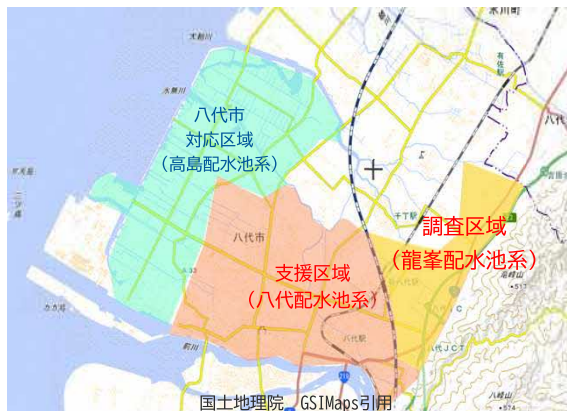

- 支援期間想定:8月1日～31日(31日間)
- 8/1～8/3まで先遣調査隊として応急復旧に係る体制整備及び復旧計画の立案
- 8/4～八代配水池系における通水試験、漏水調査
- 調査結果を基に、熊本市管工事協同組合と共に順次漏水修理
- 8/9～龍峯(りゅうほう)地区における施設及び送配水管の被害状況調査を実施

	1	10	20	31
8月				
復旧計画立案等	8/3で完了(先遣調査隊5名)			
応急復旧支援	8/31を目標に活動			

水道施設応急復旧活動状況

- 8月1日から3日間、先遣調査隊5名により応急復旧に係る体制整備や復旧計画立案を実施
- 4日より、職員11名(現地本部3名、現場対応3班×2名、補助要員2名)及び管工事組合3班体制で試験通水・漏水調査・漏水修理を実施
- 7日から現場対応班を1班追加し、職員13名体制に強化
- 9日より龍峯(りゅうほう)地区に調査隊を4名追加

		8月1日	...	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	実施 8月11日	予定 8月12日
<派遣人数>									
派遣人数	5	...	13	13	17	16	16	19*	(13)
延べ人数	5	...	65	78	95	111	111	130	(143)
<漏水修理件数>									
件数	—	...	5	5	6	6	6		
累計件数	—	...	22	27	33	39	39		

※引継ぎにより一時増員

8月10日(第2陣)の活動状況

- 【作業内容】
- ・ 全体会議・引継ぎ会議・通水試験・漏水調査・資材手配
 - ・ 漏水修理

熊本市管工事協同組合と
累計39件修理済

