


下水道事業における被災地支援の枠組みと取り組み方針

- 令和8年熊本地震で大きな被害を受けた県南4市町については、**全国ルール**（正式名称：下水道事業における災害時支援に関するルール）に基づく支援が行われる
- 熊本市は、**現地応援総括者として八代市の下水道管路調査を支援する。**
⇒スクリーニング調査(0次調査)、詳細調査(1次調査)及び管内カメラ調査(2次調査)を実施
- 「上下水道一体の災害対応」の観点から、八代市を支援中の熊本市水道管路応急復旧支援隊とも連携し、水道の復旧方針や通水予定に合わせた下水道管路の機能確保を図る
- 管路調査の支援が完了した後も、災害査定等に向けた技術的な助言を行うなど、被災地に寄り添った支援を継続していく

支援体制(八代市)

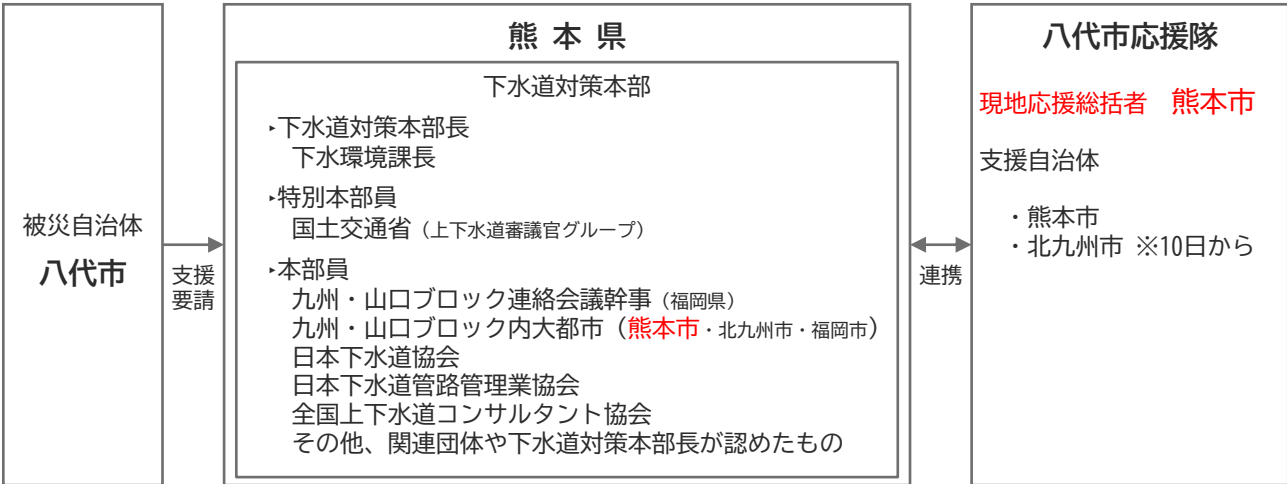

調査計画・スケジュール



- 支援期間
令和8年8月2日～
- 調査対象延長(污水管・雨水管)
ΣL≒460km
- 応援隊編成
熊本市及び北九州市

	1	10	8月	20	31
スクリーニング調査 (0次調査)	→ 8/4 完了				
詳細調査 (1次調査)	→ 8/6 完了				
管内カメラ調査 (2次調査)	8/6 開始 →				

※8月末の調査完了を目標に作業中

下水道管路調査活動状況

- 国交省や熊本県・福岡県など関係機関と連携して実施
- 8月2日から管路被災調査(460km)を実施中
- 4日にスクリーニング調査（詳細調査範囲の抽出）完了、6日に詳細調査(190km)完了
- 6日から滞水等が確認された管路について、日本下水道管路管理業協会（管路協）と連携し、管内カメラ調査(2次調査)を実施中

支援状況					実施中	予定	
〈 派遣人数 〉		8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日
	派遣人数	7	9	8	8	9	8
	延べ人数	153	162	170	178	187	195
〈 調査状況(班・km) 〉							
管路協	調査班数 ()は累計	8 (60)	17 (77)	19 (96)	19 (115)	19 (134)	
管内カメラ調査延長：L= 33km ()は累計		1.5 (10.3)	2.3 (12.6)	3.3 (15.9)	3.3 (19.2)		
	進捗率(%)	約 31 %	約 38 %	約 48 %	約 58 %		

※表中の数値は速報値のため、変動する可能性あり

昨日の活動状況（日本下水道管路管理業協会と連携し管内カメラ調査を実施中）



今後の活動状況について

＜管路協の体制＞


8/15～8/16	8/17～8/28	8/29～8/31
6～7班 (関東・関西・九州地区)	中部・中国・四国地区からの応援班が参入 最大18班体制へ増強し、調査を本格化させる予定 8～18班 (関東・関西・中部・中国・四国・九州地区)	調査結果の とりまとめ

- ピーク時である8/18～8/22頃には、応援職員を含め、**総勢200名程度での支援**となる見込み
- 8月28日までに調査を完了し、**8月31日までの作業完了を目指す**


水道事業における被災地支援の枠組みと取り組み方針

- 災害時における応急復旧活動については、日本水道協会(日水協)及び会員水道事業体における応急復旧等の相互応援活動を迅速かつ円滑に実施することを目的とした「相互応援のルール」に基づき対応。
- 本市においては、応援要請のあった八代市に対し「幹事応援水道事業体」及び「応援水道事業体」として、断水解消に向けた復旧計画立案、試験通水、漏水調査、漏水修理等の応急復旧活動の支援を実施。
- 本市は、令和8年(2026年)8月31日を目標に活動。

支援体制(八代市)

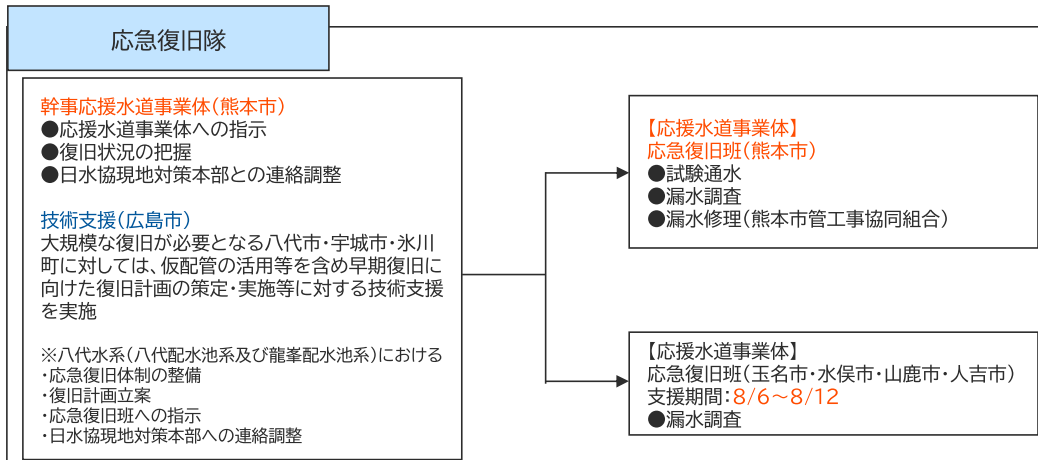

復旧計画・スケジュール

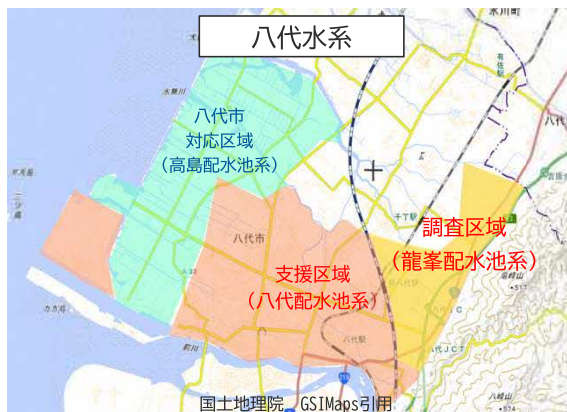

- 支援期間想定: 8月1日～31日(31日間)
 - 8/1～8/3まで先遣調査隊として応急復旧に係る体制整備及び復旧計画の立案
- 【八代配水池系】**
- 8/4～試験通水、漏水調査
 - 調査結果を基に、熊本市管工事協同組合と共に順次漏水修理
- 【龍峯(りゅうほう)配水池系】**
- 8/9～施設及び送配水管の被害状況調査を実施
 - 8/10～試験通水、漏水調査
 - 調査結果を基に、熊本市管工事協同組合と共に順次漏水修理

	1	10	20	31
8月				
復旧計画立案等	8/3で完了(先遣調査隊5名)			
応急復旧支援	8/15 八代・高島配水池系断水解消			
	8/31を目標に活動			

水道施設応急復旧活動状況

- 8月1日から3日間、先遣調査隊5名により応急復旧に係る体制整備や復旧計画立案を実施
- 4日より、職員11名及び管工事組合3班体制で試験通水・漏水調査・漏水修理を実施
- 7日～12日まで現場対応班を1班(2名)追加
- 9日より、龍峯(りゅうほう)配水池系に調査隊を派遣
- 10日より、八代配水池系の現場対応班を流動的に龍峯配水池系へ動員し、試験通水・漏水調査・漏水修理を実施
- 15日より、八代・高島配水池系における断水が解消(一部地域で給水制限継続中)

<派遣人数>		8月1日	...	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日
派遣人数	5	10	13	12	12	10		
延べ人数	5	214	227	239	251	261		

<漏水修理事件数>		8月1日	...	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日
件数	—	9	12	9				
累計件数	—	87	99	108				

<八代水系における給水制限中戸数及び断水解消戸数>		8月1日	...	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日
断水解消戸数(総給水戸数16,799戸)	0	約16,380 (約98%)	約16,380 (約98%)	約16,380 (約98%)				
断水解消戸数の内給水制限中戸数	0	約14,600	約14,600	約14,600				

8月20日の活動状況

- 【作業内容】**
- ・ 全体会議・引継ぎ会議・試験通水・漏水調査・資材手配
 - ・ 漏水修理・仮配管

熊本市管工事協同組合と
累計108件修理済

